



六月上旬—6F柱牆-7FL樑版

- 6FL樑版完成後，圖面檢核樑柱位置是否正確，接續進行6F柱牆位置放樣、鋼筋綁紮及模板組立。

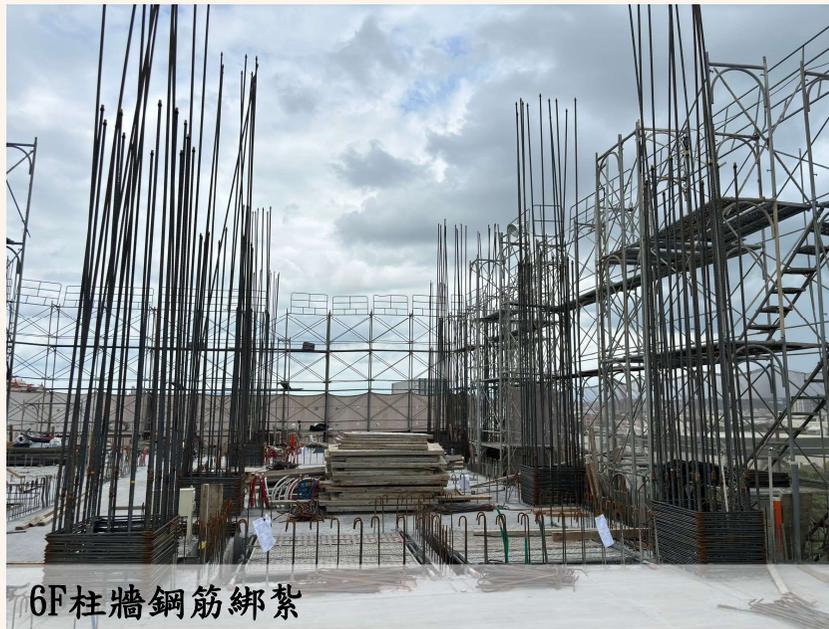


六月中下旬—6F柱牆-7FL樑版

- 6FL樑版組立完成後接續進行鋼筋綁紮及水電配管，依據客戶變更圖逐一核對施作位置是否正確。

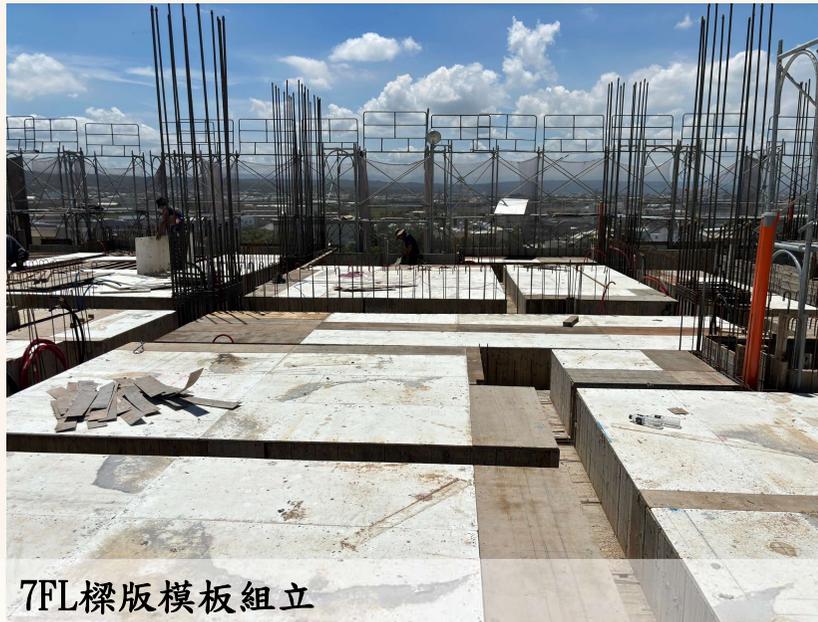

7FL樑版模板組立

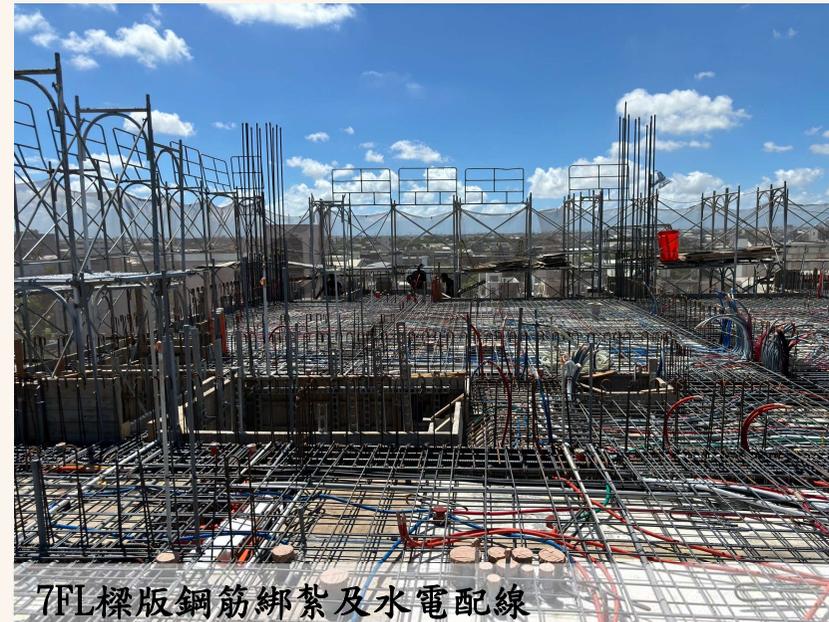

7FL樑版鋼筋綁紮及水電配線

七月上旬—6F柱牆-7FL樑版

- 七月上旬進行6F柱牆、7FL樑版混凝土澆置。

