


二月下旬-三月上旬—2F柱牆-3FL樑版(1/3)

- 二月下旬開始進行2F柱牆鋼筋綁紮及模板組立。
- 三月上旬進行3FL支撐架架設及模板組立。




三月上中旬—2F柱牆-3FL樑版(2/3)

- 2F柱牆水電配管完成後與圖面查核確認，並針對各處進行拍攝留存，柱牆完成後進行3FL樑版施作。

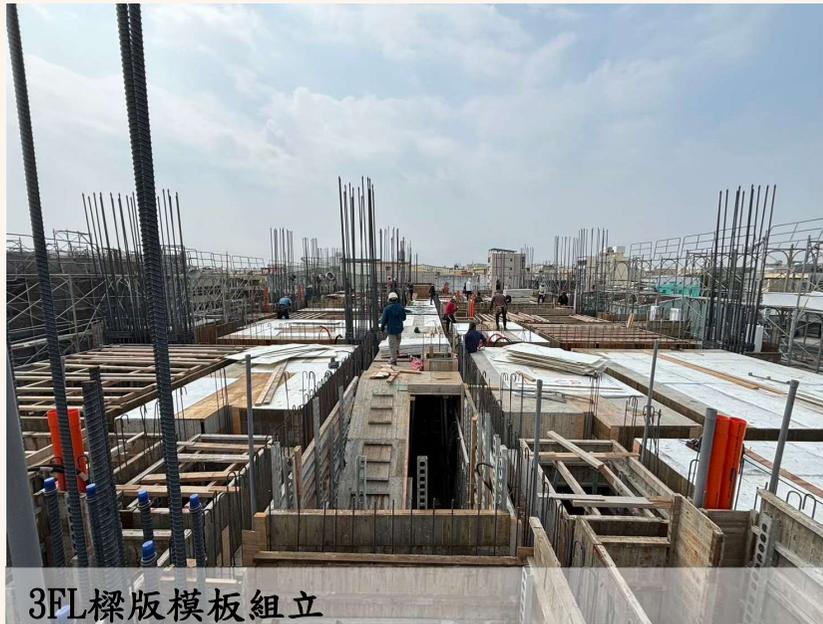

3FL樑版模板組立

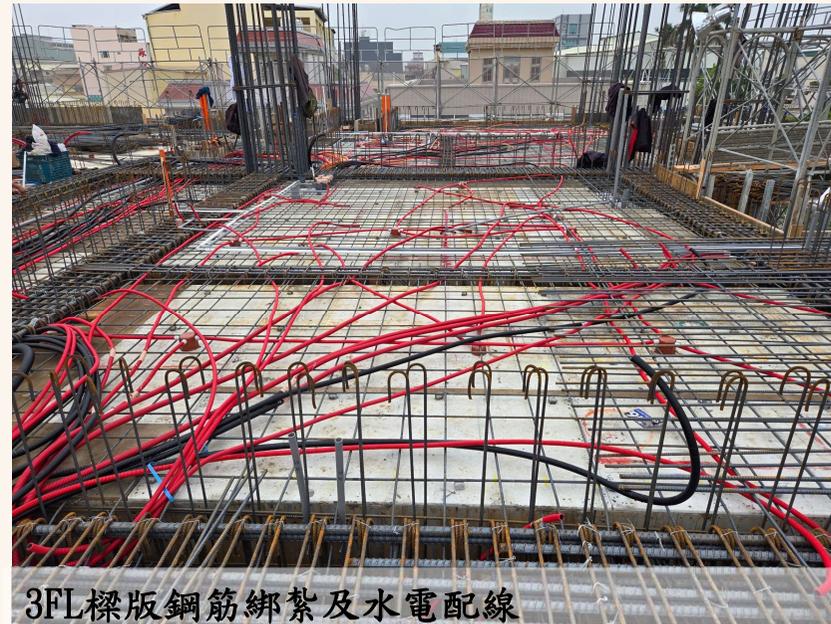


3FL樑版鋼筋綁紮及水電配線

三月中下旬—2F柱牆-3FL樑版(3/3)

- 三月中下旬進行2F柱牆、3FL樑版混凝土澆置。



2F柱牆、3FL樑版混凝土澆置

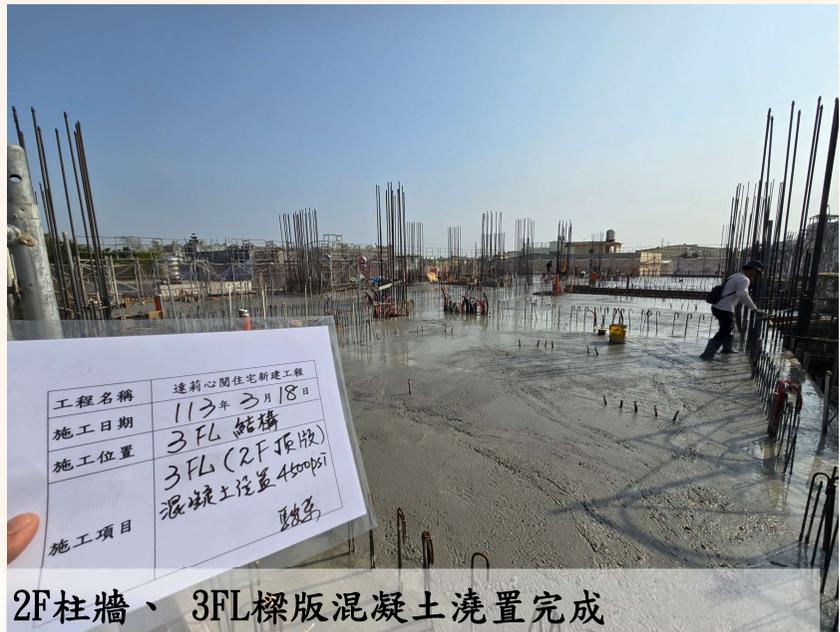

2F柱牆、3FL樑版混凝土澆置完成
