


十月上旬—B2F柱牆-B1FL樑版(1/3)

- 地下室結構體工程進行到B2F階段，需先行拆除第二層水平支撐，方可進行B2F柱牆及B1FL樑版工程。
- 十月上旬後進入B2F結構體工程，依序進行放樣、B2F柱牆鋼筋綁紮、模板組立。

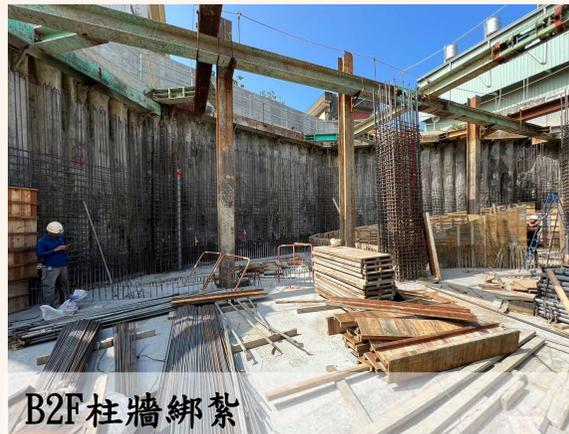


十月中下旬—B2F柱牆-B1FL樑版(2/3)

- B2F柱牆完成後進行B1FL樑版組立，並依序進行地坪鋼筋綁紮及水電配管，針對鋼筋綁紮、水電位置確實查核。



十一月上中旬—B2F柱牆-B1FL樑版(3/3)

- 全面查核鋼筋及水電配置後，進行B2F柱牆及B1FL樑版混凝土澆築。

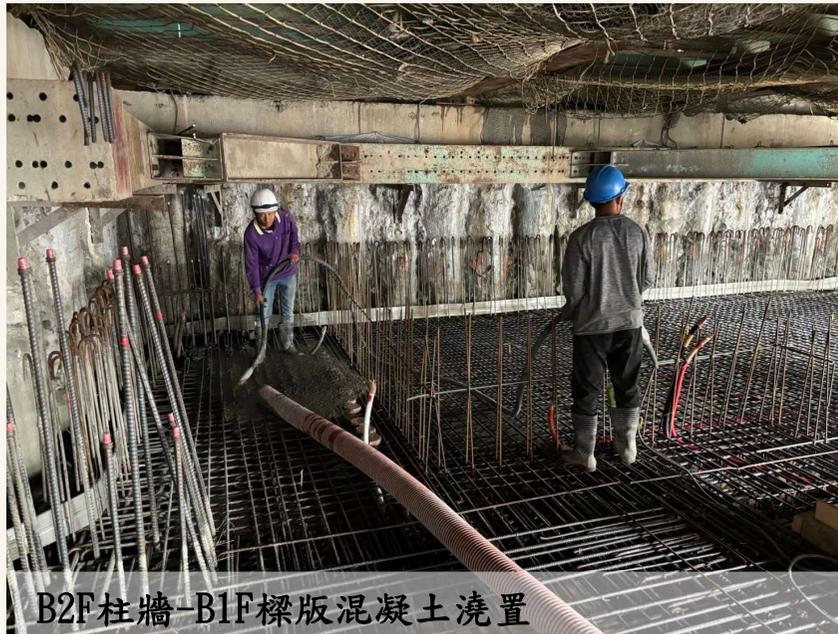

B2F柱牆-B1F樑版混凝土澆置



B2F柱牆-B1F樑版混凝土澆置完成

工程名稱	遠新心園住宅新建工程
施工日期	112年11月13日
施工位置	B1底版
施工項目	B1FL 混凝土澆置(仰)
