


1FL 鋼筋綁紮及配管

- 基礎工程完成後，進行1FL給水、瓦斯及電管配置，各戶管線依照客變規劃按圖配置至定點，查核鋼筋配置及綁紮。

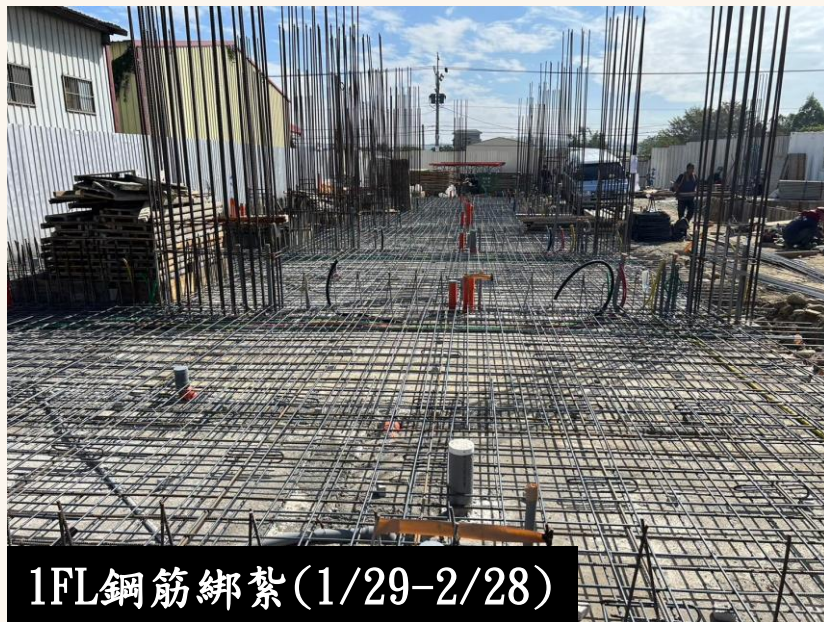

1FL 澆置及基礎結構鑑定

- 管線配置完成後，於1FL澆置混凝土前確實測試給水管試壓檢驗，以防止房屋漏水，後進行1FL混凝土澆置及養護。
- 施作主結構體前，進行基礎結構鑑定，確認施作品質無虞。



車道施作

- 社區通行車道區域開挖後，進行鋼筋綁紮及模板組立，隨後施作混凝土澆置。



車道-開挖(2/28-3/2)



車道-混凝土澆置(3/3-3/5)

五大管線施作

- 車道施作完成後，各戶別之五大管線，即電力、自來水、瓦斯、電信及污水，需彙整連至公共系統，故進行預埋管路以及覆蓋之混凝土澆置工程。



五大管線-預埋管路(3/8-3/14)



五大管線-混凝土澆置(3/15-3/19)
